

REGISTRE

ACCESSIBILITÉ

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC



CNISAM
INNOVATION
DES ESPACES

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est à l'origine de la réglementation sur l'accessibilité des établissements et des installations recevant du public.

Le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmé, dit Ad'AP, est une étape obligatoire pour tout établissement ne répondant pas aux exigences d'accessibilité actuelles.

Le CNISAM (Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers) accompagne les entreprises artisanales et petites entreprises à intégrer entre autres les aspects réglementaires en matière d'accessibilité. Seul pôle national d'innovation dédié au secteur de l'artisanat sur les questions d'autonomie et de silver économie, le CNISAM vous propose un registre d'accessibilité gratuit et facile à compléter.


Ce présent registre a été conçu pour les ERP de 5ème catégorie. Il vous permet de faire le point régulièrement sur l'avancée des travaux. Le tenir à jour vous permet de justifier des réalisations et du bon déroulement de votre Ad'AP.

Comment remplir votre registre ?

Commencez par remplir la fiche identité propre à votre ERP. Vérifiez ensuite point par point la conformité de votre ERP et complétez les tableaux en fonction des travaux prévus et ceux déjà réalisés. En cas de doute, nous vous conseillons de télécharger gratuitement la brochure « L'accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public des ERP et IOP de 5^e catégorie » éditée par le CNISAM (nov. 2015).

- Nature de la réalisation : un bref descriptif des aménagements envisagés,
- Délais de réalisation : la date butoir prévue dans votre Ad'AP pour cette réalisation,
- Coût : une estimation des frais engagés dans cette réalisation (il peut ne pas y avoir de coût)
- Validation à la réception : à remplir une fois la réalisation terminée,
- Date : la date de fin de réalisation de l'aménagement (elle peut être antérieure au délai de réalisation).

Dès qu'un nouvel élément d'accessibilité est mis en place dans votre ERP, reprenez ce document pour le mettre à jour.

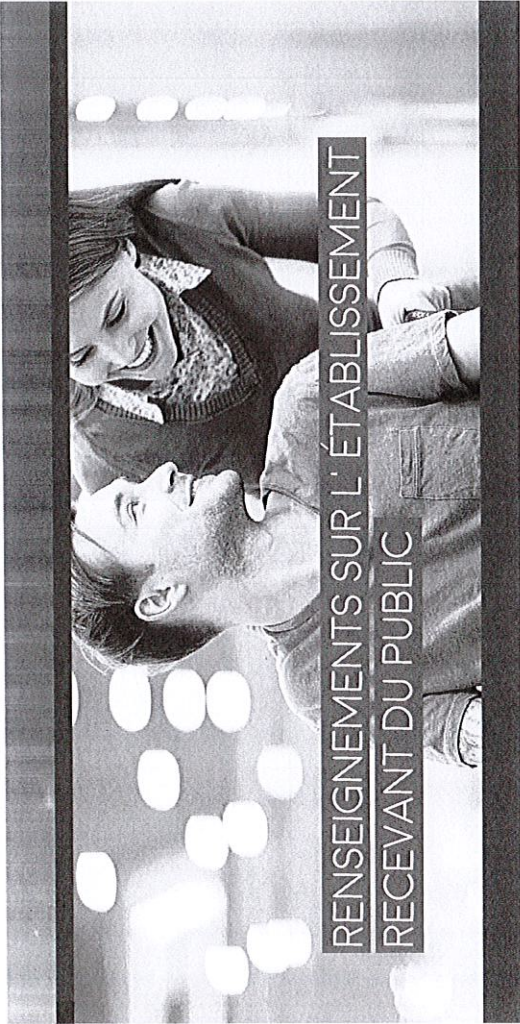

Raison sociale : *École de Saint-Léger-sur-Vouzance*
Adresse : *Rue de l'École*

Code postal : *03130* Ville : *SAINT-LEGER-SUR-VOUZANCE*
Téléphone : *04 70 55* Fax :

Site web : Email : *POIGNANT Bernard*

Nom du représentant de la personne morale :
Siret : *210302394 00015* Naf :
Activité : *École*

L'établissement fait-il partie de la 5^{ème} catégorie : OUI ☒ NON ☐
Effectif de l'ERP : Personnel : *1* Public : Total :

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI ☐ NON ☐
Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI ☐ NON ☒

Si oui à quelle date :
Existe-il un registre de sécurité : OUI ☒ NON ☐

5 6

SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME : OUI ☒ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

ÉCLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

CONFORME :

OUI ☒

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

7

8

CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1,20 m (tolérance 0,90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie $\geq 0,15$ m
- Dévers sur les cheminements ≤ 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Éléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre $\leq 2,20$ m sous élément suspendu

CONFORME :

OUI ☒

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

9

10

PARKING

En cas de place de parking, 2 % du pare doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

CONFORME : OUI ☒ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisat d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

CONFORME : OUI ☒ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

11

12

ASCENSEUR ET PLATEFORME ÉLEVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m
- Charge minimale supportée ≥ 300 kg

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

ESCALIER ≤ 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche ≤ 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

13

14

ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

CONFORME : OUI ☒ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PLAN INCLINÉ. RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers ≤ à 3 %

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

15

16

DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

17

18

PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

19

20

TOILETTES

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débâtement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débâtement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan $\leq$ 0.85 m

CONFORME : OUI ☐ NON ☒ PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME :

OUI ☒

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

21

22

CABINE D'ESSAYAGE

- Rayon de giration (diamètre 1.50 m) en dehors du débâtement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)
- Barres de maintien assis / debout (0.80 m à 1.00 m)

CONFORME :

OUI ☐

NON ☐

PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

SALLE DE RESTAURATION

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1,20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0,90 m – 0,60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0,80 m x 1,30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0,80 m
- Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (Hauteur entre 0,60 m et 1,30 m. Longueurs/Profondeurs 0,50 m)

CONFORME :

OUI ☐ NON ☐

PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

23

24

SALLE D'EAU (DOUCHE, BAIGNOIRE)

- Rayon de giration (diamètre 1,50 m), chevauchement du débatement de la porte ≤ 0,25 m
- Espace d'usage ou de transfert (0,80 m x 1,30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0,80 m à 1,00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0,90 m et 1,30 m)

CONFORME :

OUI ☐ NON ☐

PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

CHAMBRE

NOTES ET OBSERVATIONS

- Les chambres doivent faire l'objet d'une identification visuelle et tactile sur la porte
- Rayon de giration (diamètre 1.50 m), chevauchement du débatement de la porte ≤ 0.25 m
- Largeur cheminement ≥ 0.90 cm
- Angle droit autour du lit (respect de la règle des L1+L2 ≥ 2 m)

CONFORME : OUI ☐ NON ☐ PAS CONCERNÉ ☒

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

25

26



Région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

CNISAM - Service de la Chambre Régionale de Métiers
et de l'Artisanat de la Nouvelle Aquitaine
14 rue de Belfort CS 71300 - 87060 LIMOGES cedex
Tél : 05 55 79 40 70 / contact@cnisam.fr

WWW.CNISAM.FR



RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

DGE
DIRECTION GÉNÉRALE
DES ÉNERGIES
ET CLIMATS

l'Europe
s'engage
en Limousin
avec le PDR

* Signature provisoire: le nom de la Région sera Act par décret en Conseil d'Etat avant le 20 octobre 2010 suite à l'avis du Conseil Régional
